

**УТВЕРЖДЕНА**  
 распоряжением Главного управления  
 территориальной политики  
 Московской области  
 от 30.10.2020 № 18

### ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
 Наименование муниципального образования - г.о. Реутов

Наименование проекта - Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка Деревьев и кустарников в мкр.  
 2,6,7,9,9А,10,10А

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения	
	ДС1	ДС2	ДС3	всего 5 = 6 + 7+8	ДС1	ДС2				ДС3
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+8	9 = 10 + 11+12	10	11	12	13=5-9	
633800 0,00	500000 0,00	127400 0,00	64000 ,00	633800 0,00	500000 0,00	127400 0,00	64000 ,00	186940 5,44	147475 33064 64000	4468600,00 - -

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) — 26.10.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта — 05.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 17 листах: фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор (представитель инициативной группы):

М.В. Никитина

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

С.А. Каторов

(Ф.И.О.)



(подпись)



М.П.

Дата «26» ноября 2020 г.

Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





**Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А**



**Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А**





**Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А**



Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





**Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А**





**Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А**





**Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А**





Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А







Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А

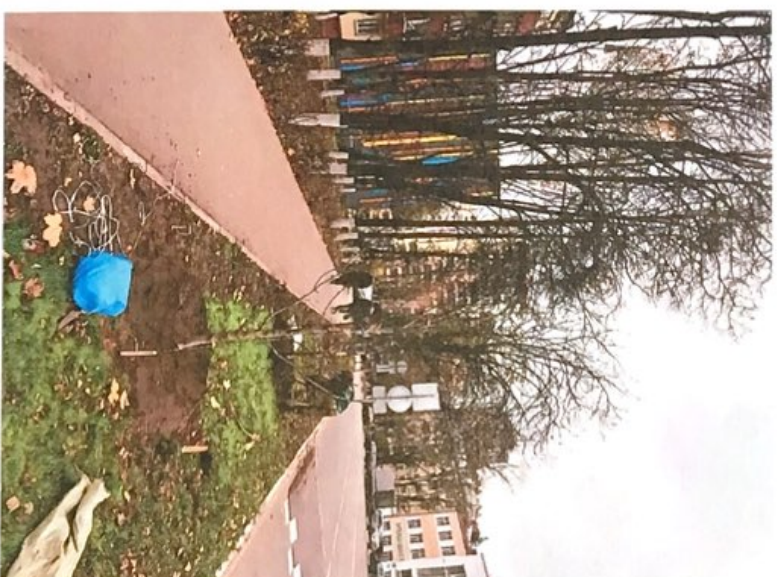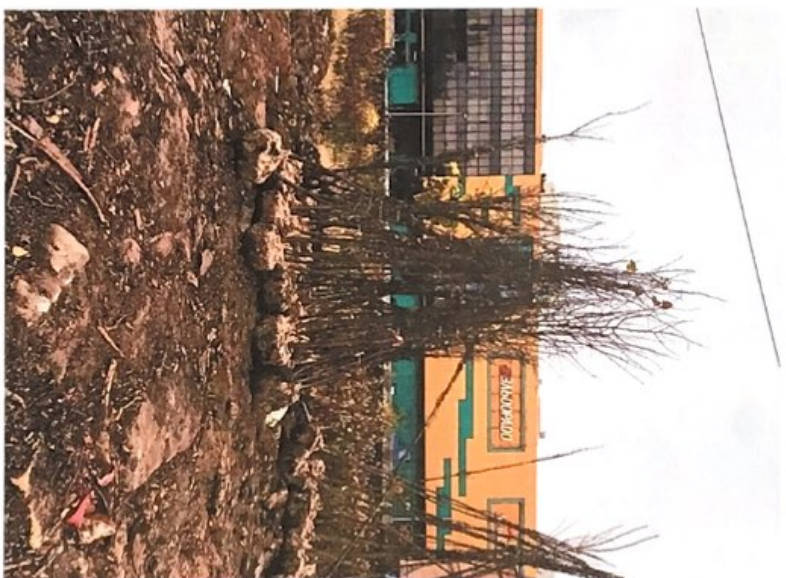



Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А



Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А





Реализация проекта "Зеленый каркас" города Реутов: посадка  
деревьев и кустарников в мкр. 2,6,7,9,9А,10,10А

