

«УТВЕРЖДЕНА распоряжением
Главного управления
территориальной политики
Московской области от
30.10.2020 № 18 (в редакции
распоряжения Главного
управления территориальной
политики Московской области от
16.08.2021 №9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования - г.о. Реутов
Наименование проекта – Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.,	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
6850000	3 000 000	3781000	69 000	6816095	2 985 000	3 762 095	69 000	6 815 750	2 985 000	3 762 095	68 655	345	

*- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организации, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: задержка подрядчиком исполнения обязательств по контракту.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24.08.2021
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 27.10.2021
5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Бочкарев В.В.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа:

С.А. Каторов

(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата «11» ноября 2021 г.

Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»



Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»




Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»



Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»



Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»

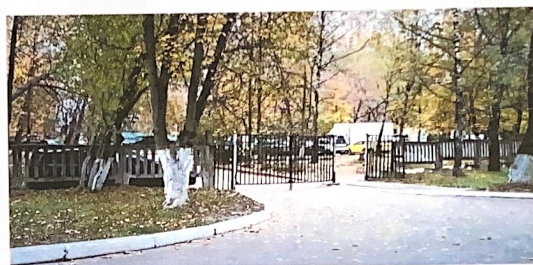

Замена ограждения МБОУ «СОШ №7»

